

VISUEEL INSPECTIERAPPORT Conform NEN 2990:2012

Opdrachtgever:	
Projectnummer opdrachtgever:	A141033
Opdrachtgever:	Heezen BV
Adres:	Boven Zijde 7 te Eindhoven
Contactpersoon:	Dhr. A. Özel
Adres locatie:	Heers 15b te Veldhoven
Naam analist:	Dhr. N.F. Joosten
Datum inspectie:	11-3-2015
Tijd op locatie (totaal):	1 uur
Aankomst:	15:30
Vertrek:	16:30
Tijd inspectie object:	30 min
Temperatuur (°C):	12.7

Visuele inspectie:		
Gegevens inventarisatierapport:	A&M AR1909012	
Plaats waar is gesaneerd (binnen/buiten + locatie) :	Buiten	Dak Schuur
Soort verwijderd materiaal:	Golfplaat	90 m2
Asbestsoort + gewichtspercentage(%):	Chrysotiel	10-15%
Asbestsoort + gewichtspercentage(%):	Crocidoliet	2-5%
Hechtgebondenheid:	Hechtgebonden	
Bronnummer:	B01	
Risicoklasse sanering :	2	
Inspectiegebied reeds vrijgegeven door DTA-er:	Ja	

Inspectie randvoorwaarden		Opmerkingen:
Is er een sloopmelding aanwezig? :	Ja	
Weersomstandigheden:	Helder	
Situatie inspectiegebied:	Droog	35x20 m
Inspectiegebied:	Buiten	
Is er (te saneren) asbesthoudend materiaal aanwezig binnen het werkgebied? :	Nee	
Is er voldoende belichting?	Ja	
Inzage werkplan en eventuele afwijkingen:	Ja	Geen
Opmerking: Alles onder het zichtbaar maaiveld valt buiten de visuele inspectie		

Inspectie bouw en constructiedelen			Opmerkingen
Locatie/bouwdeel	Aanwezig	Resultaat	
Plafond (constructiedelen)	Ja	V	
Kabelgoten en/of doorvoering	Nee	N.v.t.	
Ventilatiekanalen	Nee	N.v.t.	
Buizen	Nee	N.v.t.	
Verwarmingselementen	Nee	N.v.t.	
Kozijnen	Nee	N.v.t.	
Plinten	Nee	N.v.t.	
Vloer	Ja	V	
Machines, installaties	Nee	N.v.t.	
Overige, nl. verreiker	Ja	V	
Overige, nl. Hooi op zolder	Ja	V	Is afgezeild geweest, inspectie OK.
Transitroute	Nee	N.v.t.	
Opmerking: Alles onder het zichtbaar maaiveld valt buiten de visuele inspectie			

V = in orde bevonden

V(2) = in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak

A = afkeur vanwege het aantreffen van asbest, asbestrestanten en/of stof die vezelemisatie kunnen veroorzaken

N.v.t. = niet van toepassing

Locatie/bouwdeel	Resultaat			Opmerkingen (eventuele kleefmonsters)
	Constructiedeel	Aangelegende delen	Ondergelegen oppervlak	
Segment 1	V	V	V	N.v.t.
Segment 2	V	V	V	N.v.t.
Segment 3	V	V	V	N.v.t.
Niet geïnspecteerde delen: Nee				
Is het gebied in segmenten verdeeld? : Ja (3)				

V = in orde bevonden

V(2) = in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak

A = afkeur vanwege het aantreffen van asbest, asbestrestanten en/of stof die vezelemisatie kunnen veroorzaken

N.v.t. = niet van toepassing

CONCLUSIE VISUELE INSPECTIE

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn Geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voor zover deze onderdeel uitmaken van de sanering. Het saneringsgebied kan WEL worden vrijgegeven voor vervolgwerkzaamheden.

Naam Analist:

Dhr. N.F. Joosten

Handtekening



Naam DTA-er saneringsbedrijf

Dhr. A. Özel

Handtekening



FOTOBLAG:



Saneringslocatie



Situatie Deco



Bron 1 verwijderd



Inspectie vloer schuur



Inspectie hooizolder





Inspectie maaiveld rondom










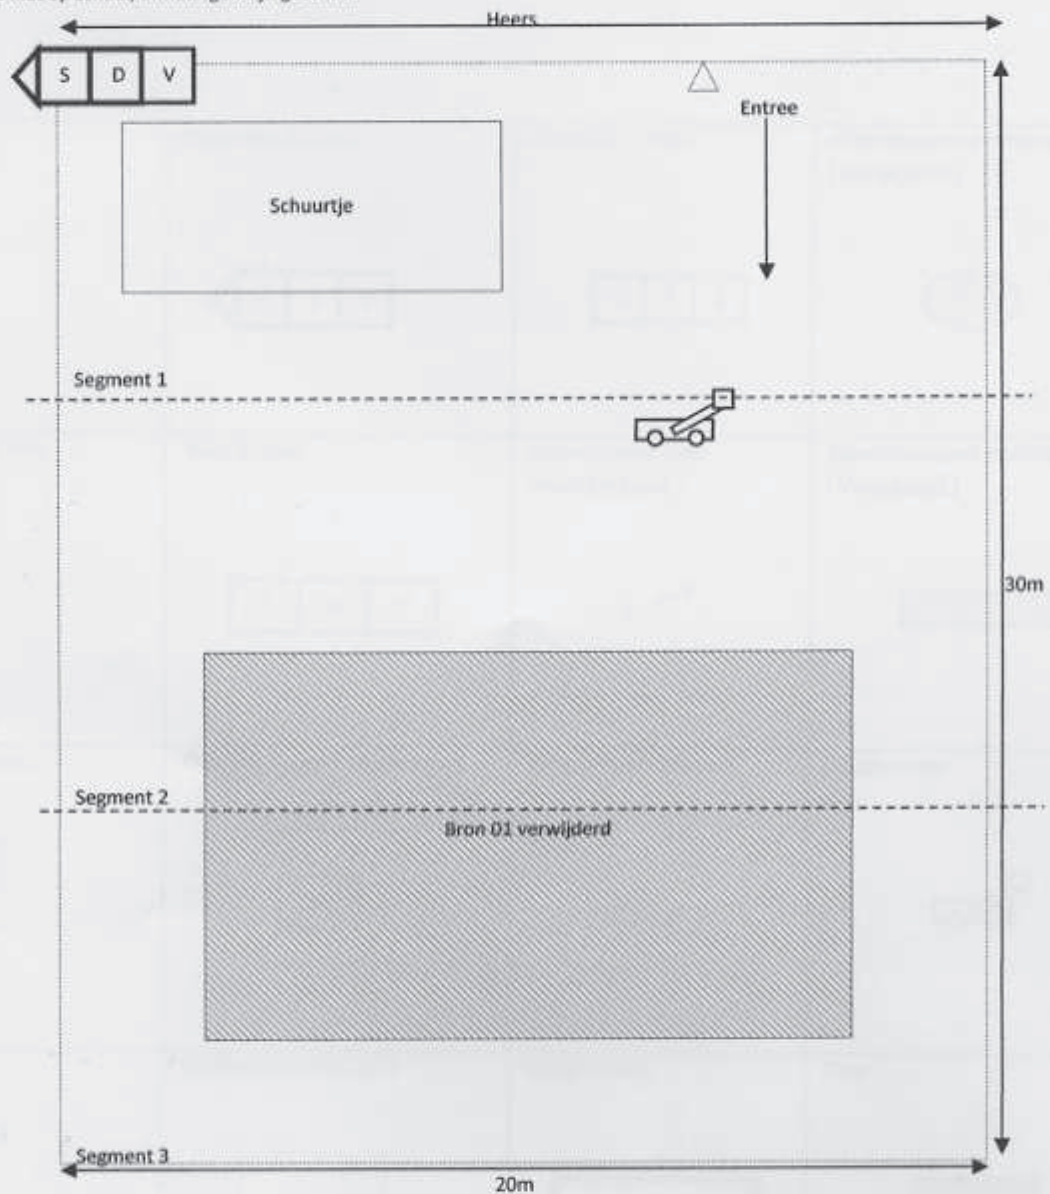



Situatieschets:

Heers 15b te Veldhoven

Situatieschets niet op schaal, afmetingen zijn geschat.



Situatie schets d.d.: 11-3-2015	= verwijderd materiaal	= deco	
Initialen laborant: NFJ	= verwijderd materiaal	Afstanden in m.	
..... = lint	= waarschuwbord	= fotorichting	

<p>Containment</p> 	<p>Deco-unit 3-traps</p> 	<p>Afvalsluis 3-traps</p> 	<p>Asbesthoudend materiaal (Verwijderd)</p> 
<p>Situatie schets d.d.:</p>	<p>Sluis 3-traps</p> 	<p>Fotonummer met fotostandpunt</p> 	<p>Asbesthoudend materiaal (Verwijderd)</p> 
<p>Initialen laborant:</p>	<p>O.D.M.(onderdrukmaschine)</p> 	<p>Waarschuingsbord</p> 	<p>Hoogwerker</p> 
<p>Lint</p> 	<p>Lucht pomp (incl. nr.)</p> 	<p>Containment</p> 	<p>Trap</p> 
